

Gestion de Projets

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	07/12/2024	Version Initiale

Sommaire

Gestion de projet.....	2
Introduction.....	2
Importance.....	2
Le Cahier des Charges : Définition et Rôle.....	3
Objectifs du Cahier des Charges.....	3
Importance du Cahier des Charges.....	3
Composants d'un Cahier des Charges.....	3
Contexte et présentation du projet :.....	3
Objectifs du projet :.....	3
Exigences fonctionnelles :.....	3
Exigences techniques :.....	3
Planning et délais :.....	3
Budget et ressources :.....	4
Critères de validation et de contrôle :.....	4
Contraintes et risques :.....	4
Les méthodes de gestion de projets.....	4
Logiciel Méthode Agile :Taiga.....	4
Logiciel Méthode en V : OpenProject.....	4
Logiciel Méthode diagramme de Gantt : GanttProject.....	5
Logiciel Méthode de PERT : ProjectLibre.....	5
Logiciel méthode Kanban : Trello.....	6
Comparatif des différentes méthodes.....	6
En Bref :.....	7

Gestion de projet

Introduction

La **gestion de projet** est un processus essentiel dans toute organisation, visant à planifier, organiser, exécuter, et contrôler les ressources et les activités nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques dans un délai imparti, en respectant un budget et en répondant à des critères de qualité. Dans un environnement dynamique et souvent incertain, la gestion de projet permet d'assurer que les projets sont réalisés de manière efficace, efficiente et cohérente avec les attentes des parties prenantes.

Elle repose sur un ensemble de méthodologies, d'outils et de techniques qui permettent de structurer, suivre et ajuster les actions au fur et à mesure de l'avancement du projet. Parmi les principales étapes de gestion de projet, on retrouve la définition des objectifs, la planification des tâches, la gestion des ressources humaines et matérielles, la gestion des risques, ainsi que le suivi de la qualité.

Importance

1. **Optimisation des ressources** : La gestion de projet aide à allouer les ressources de manière optimale, en minimisant les gaspillages et en maximisant l'efficacité.
2. **Respect des délais et du budget** : Une bonne gestion permet de s'assurer que les projets sont livrés à temps et dans les limites du budget prévu, ce qui est essentiel pour la rentabilité de l'organisation.
3. **Qualité du livrable** : La gestion de projet permet de garantir que les produits ou services livrés répondent aux attentes des clients ou des utilisateurs finaux.
4. **Adaptabilité aux changements** : La gestion de projet permet de s'adapter aux changements inévitables du projet (évolution des besoins, problèmes imprévus, nouvelles priorités).

Le Cahier des Charges : Définition et Rôle

Le **cahier des charges** est un document essentiel dans la gestion de projet, notamment dans les domaines du développement logiciel, de la construction, ou des services. Il sert de référence pour définir de manière détaillée les attentes, les exigences et les contraintes d'un projet. Le cahier des charges permet d'assurer la bonne compréhension entre les différentes parties prenantes (client, équipe de projet, fournisseurs, etc.) et constitue un outil fondamental pour le pilotage et la réussite du projet.

Objectifs du Cahier des Charges

1. **Clarifier les attentes** : Le cahier des charges permet de formaliser les besoins du client ou des utilisateurs finaux, et de les traduire en exigences spécifiques.
2. **Fixer les objectifs du projet** : Il définit les objectifs à atteindre, les résultats attendus, ainsi que les critères de performance et de qualité.
3. **Éviter les malentendus** : En précisant les éléments techniques, fonctionnels, financiers et temporels, il minimise les risques de malentendus entre le client et l'équipe projet.
4. **Encadrer les engagements** : Le cahier des charges sert de base pour établir un contrat et peut être utilisé pour évaluer l'avancement et la conformité du projet.

Importance du Cahier des Charges

1. **Base de communication** : Il sert de référence commune pour toutes les parties prenantes et assure que les attentes sont bien comprises de manière uniforme.
2. **Gestion des attentes** : Il permet de définir clairement ce qui est inclus dans le projet et ce qui ne l'est pas, réduisant ainsi les risques de changements ou d'ajouts non prévus.
3. **Suivi et contrôle** : Il offre un cadre pour mesurer les progrès et évaluer si les résultats du projet sont conformes aux attentes initiales.
4. **Prévention des conflits** : En définissant les critères de succès, les obligations, et les responsabilités, il permet de limiter les malentendus et les conflits tout au long du projet.

Composants d'un Cahier des Charges

Un cahier des charges se compose généralement des éléments suivants :

Contexte et présentation du projet :

- Description du projet, de son environnement et des objectifs à atteindre.
- Présentation du client, des utilisateurs et des parties prenantes.

Objectifs du projet :

- Précision des résultats attendus et des bénéfices pour le client ou l'organisation.
- Identification des critères de succès.

Exigences fonctionnelles :

- Définition des fonctionnalités spécifiques que le produit ou le service doit offrir.
- Explication des tâches ou des processus à automatiser ou à améliorer.

Exigences techniques :

- Spécifications des technologies, des plateformes et des outils à utiliser.
- Contraintes liées aux normes, à la sécurité, à la compatibilité, etc.

Planning et délais :

- Calendrier du projet avec les grandes étapes et les échéances.
- Définition des délais pour la livraison des différentes phases ou livrables.

Budget et ressources :

- Estimation des coûts, des ressources humaines et matérielles nécessaires.
- Précisions sur les contraintes budgétaires et financières.

Critères de validation et de contrôle :

- Indicateurs de performance et critères d'acceptation pour chaque phase du projet.
- Méthodes et outils pour le suivi et l'évaluation des progrès.

Contraintes et risques :

- Identification des risques potentiels, notamment techniques, financiers, ou organisationnels.
- Plan de gestion des risques et des imprévus.


Les méthodes de gestion de projets

Agile :

Méthode itérative et flexible qui privilégie les sprints courts, la collaboration avec le client et l'adaptation continue aux besoins changeants.

Logiciel Méthode Agile :Taiga

<https://www.taiga.io>

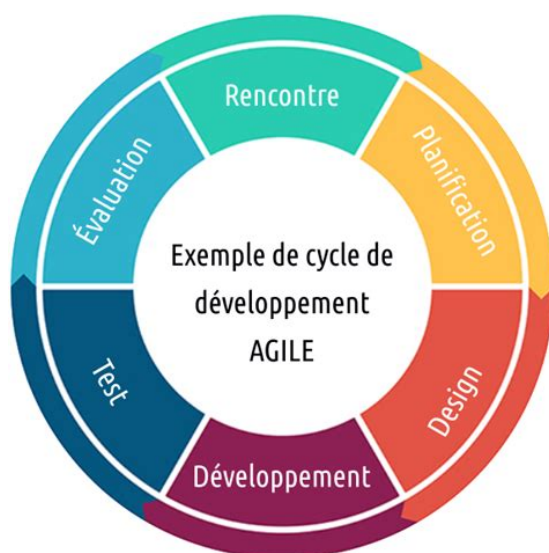

Méthode en V :

Approche séquentielle et structurée où chaque phase de conception est suivie d'une phase de test correspondante. Idéale pour des projets bien définis et avec peu de changements.

Logiciel Méthode en V : OpenProject

<https://www.openproject.org>

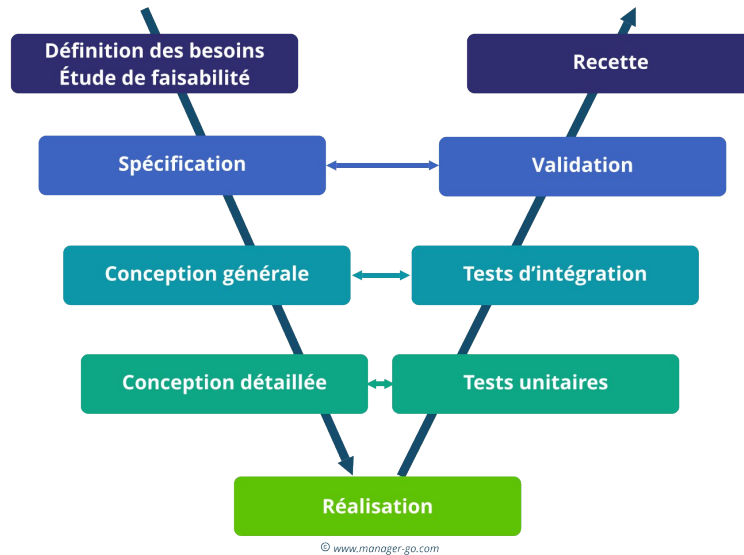


Diagramme de Gantt :

Outil visuel de planification qui représente les tâches du projet et leur avancement sur une ligne de temps. Utilisé pour des projets avec des tâches bien définies et des échéances fixes.

Logiciel Méthode diagramme de Gantt : GanttProject

<https://www.ganttproject.biz/download/free>


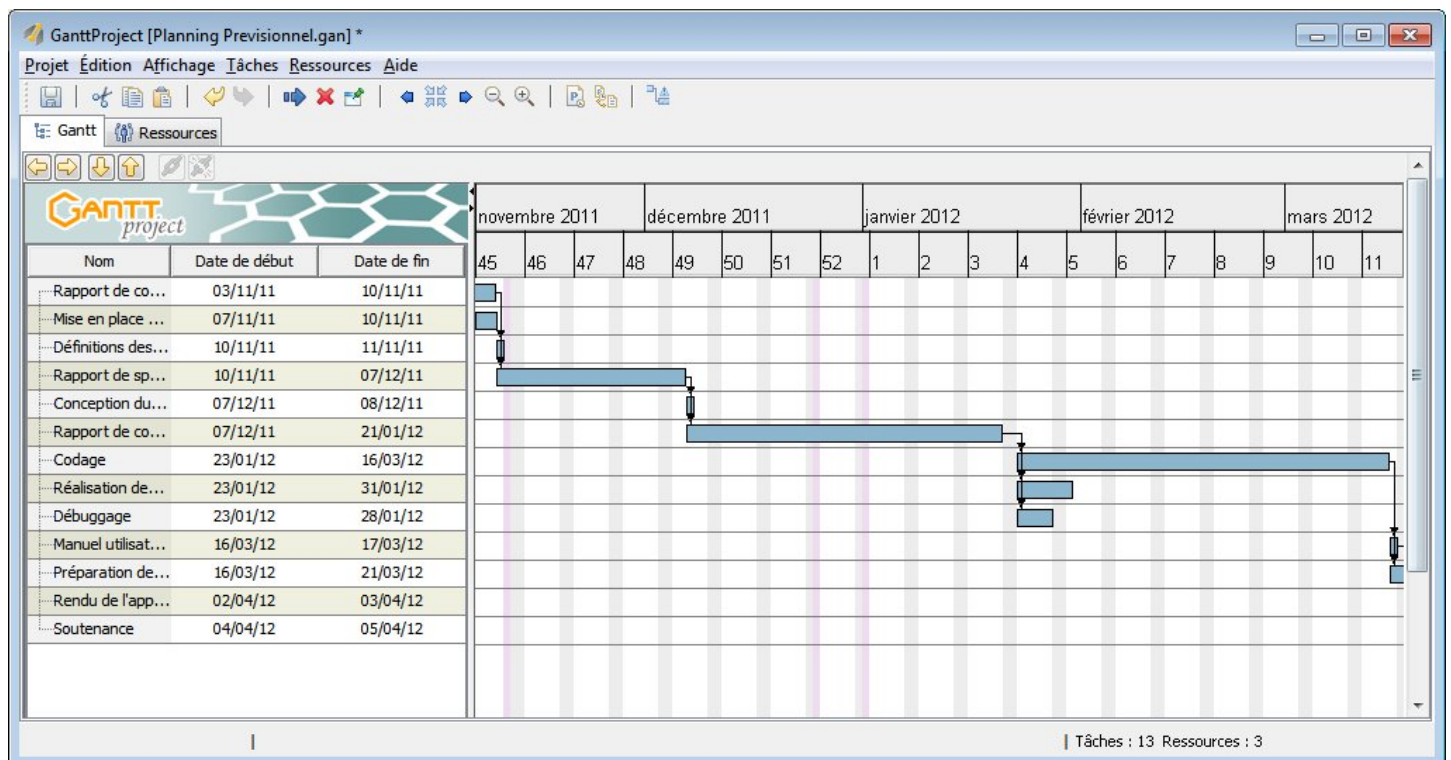


Diagramme de PERT (Program Evaluation and Review Technique) :

Représentation graphique des tâches et de leurs dépendances. Utilisé pour les projets complexes où les relations entre les tâches et les délais doivent être optimisés.

Logiciel Méthode de PERT : ProjectLibre

<https://sourceforge.net/projects/projectlibre/>

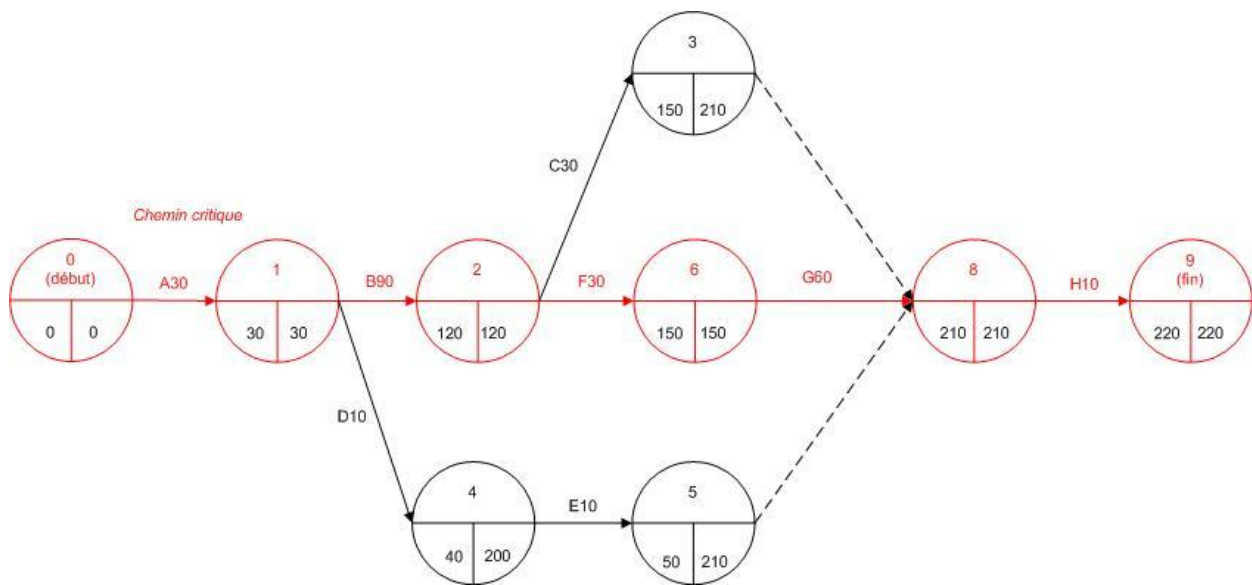


Kanban :

Méthode visuelle pour gérer les flux de travail, en divisant les tâches en colonnes (par exemple, "À faire", "En cours", "Terminé"). Idéale pour les projets à flux continu et nécessitant une grande flexibilité.

Logiciel méthode Kanban : Trello

<https://trello.com/fr/platforms>

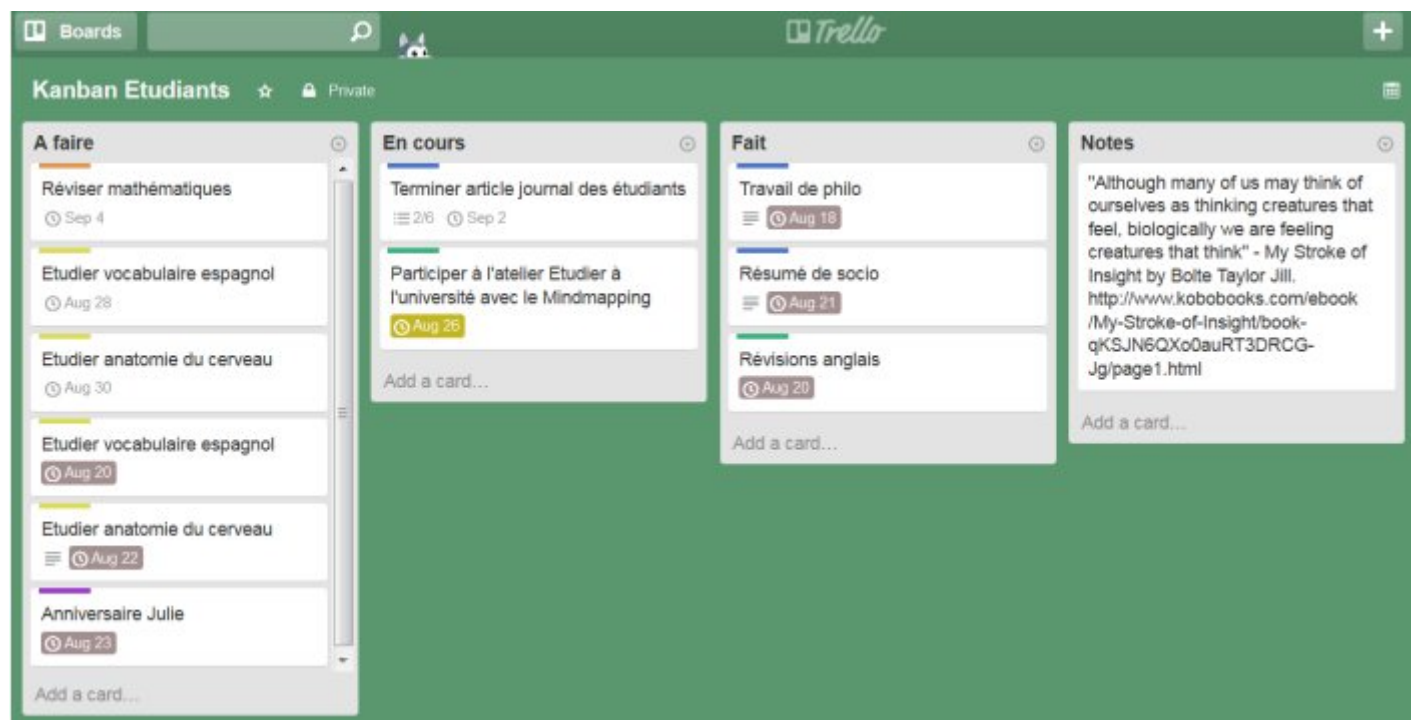

Comparatif des différentes méthodes

Voici un tableau comparatif des différentes méthodes de gestion de projet mentionnées : Agile, Méthode en V, Diagramme de Gantt, Diagramme de PERT, et Kanban.

Ce tableau met en lumière les principales caractéristiques, avantages et inconvénients de chaque méthode.

Méthode	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients
---------	------------------	-----------	---------------

Agile	- Méthode itérative et incrémentale.	- Adaptation rapide aux besoins changeants.	- Difficulté à gérer les grands projets.
	- Sprints ou itérations courtes.	- Collaboration étroite avec le client.	- Manque de structure pour les projets très complexes.
Méthode en V	- Collaboration continue avec le client.	- Meilleure réactivité et flexibilité.	- Peut entraîner des incohérences si mal géré.
	- Flexibilité pour s'adapter aux changements.		
Gantt	- Phases linéaires et séquentielles : conception, développement, tests.	- Structure claire et méthodique.	- Peu flexible face aux changements en cours de projet.
	- Chaque phase de conception a une phase correspondante de test.	- Tracabilité des exigences.	- Long délai entre la phase de conception et la mise en production.
PERT	- Planification visuelle des tâches et des ressources.	- Garantit des tests à chaque étape du développement.	- Peut être coûteuse en temps.
	- Suivi des tâches selon un calendrier avec des barres de progression.		- Peu adapté aux projets flexibles ou évolutifs.
Kanban	- Visualisation claire de l'avancement du projet.	- Utile pour des projets avec des tâches bien définies et des échéances précises.	- Difficulté à ajuster rapidement en cas de changements.
	- Représentation des tâches sous forme de diagramme avec des dépendances.		- Moins efficace pour les projets complexes.
	- Estimation des durées avec des probabilités.	- Permet d'identifier les tâches critiques et les dépendances.	- Nécessite une bonne connaissance des relations entre les tâches.
		- Utile pour la planification des projets complexes.	- Peut être complexe à mettre en place pour des projets simples.
	- Aide à estimer les délais.		- Ne fournit pas une planification complète pour un projet.
	- Méthode visuelle avec des tableaux pour suivre les tâches.	- Très flexible et facile à mettre en œuvre.	- Peut être difficile à appliquer à des projets très complexes avec de nombreuses dépendances.
	- Flux de travail divisé en colonnes : « À faire », « En cours », « Terminé ».	- Idéal pour les environnements de travail continus.	
		- Aide à visualiser et limiter les goulots d'étranglement.	

En Bref :

- **Agile** est idéale pour des projets flexibles où les besoins peuvent évoluer.
- **Méthode en V** convient à des projets bien définis et structurés, mais manque de flexibilité.
- **Diagramme de Gantt** est utile pour la planification et le suivi de projets avec des tâches bien définies et des délais précis.
- **Diagramme de PERT** est adapté aux projets complexes où il est essentiel de comprendre les relations et dépendances entre les tâches.
- **Kanban** est particulièrement efficace pour les environnements où les tâches sont continues et où la flexibilité est importante.

Sources

<https://fr.wikipedia.org/wiki/PERT>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/GanttProject>

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_\(d%C3%A9veloppement\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(d%C3%A9veloppement))

<https://www.openproject.org/fr/telechargement-et-installation/>
